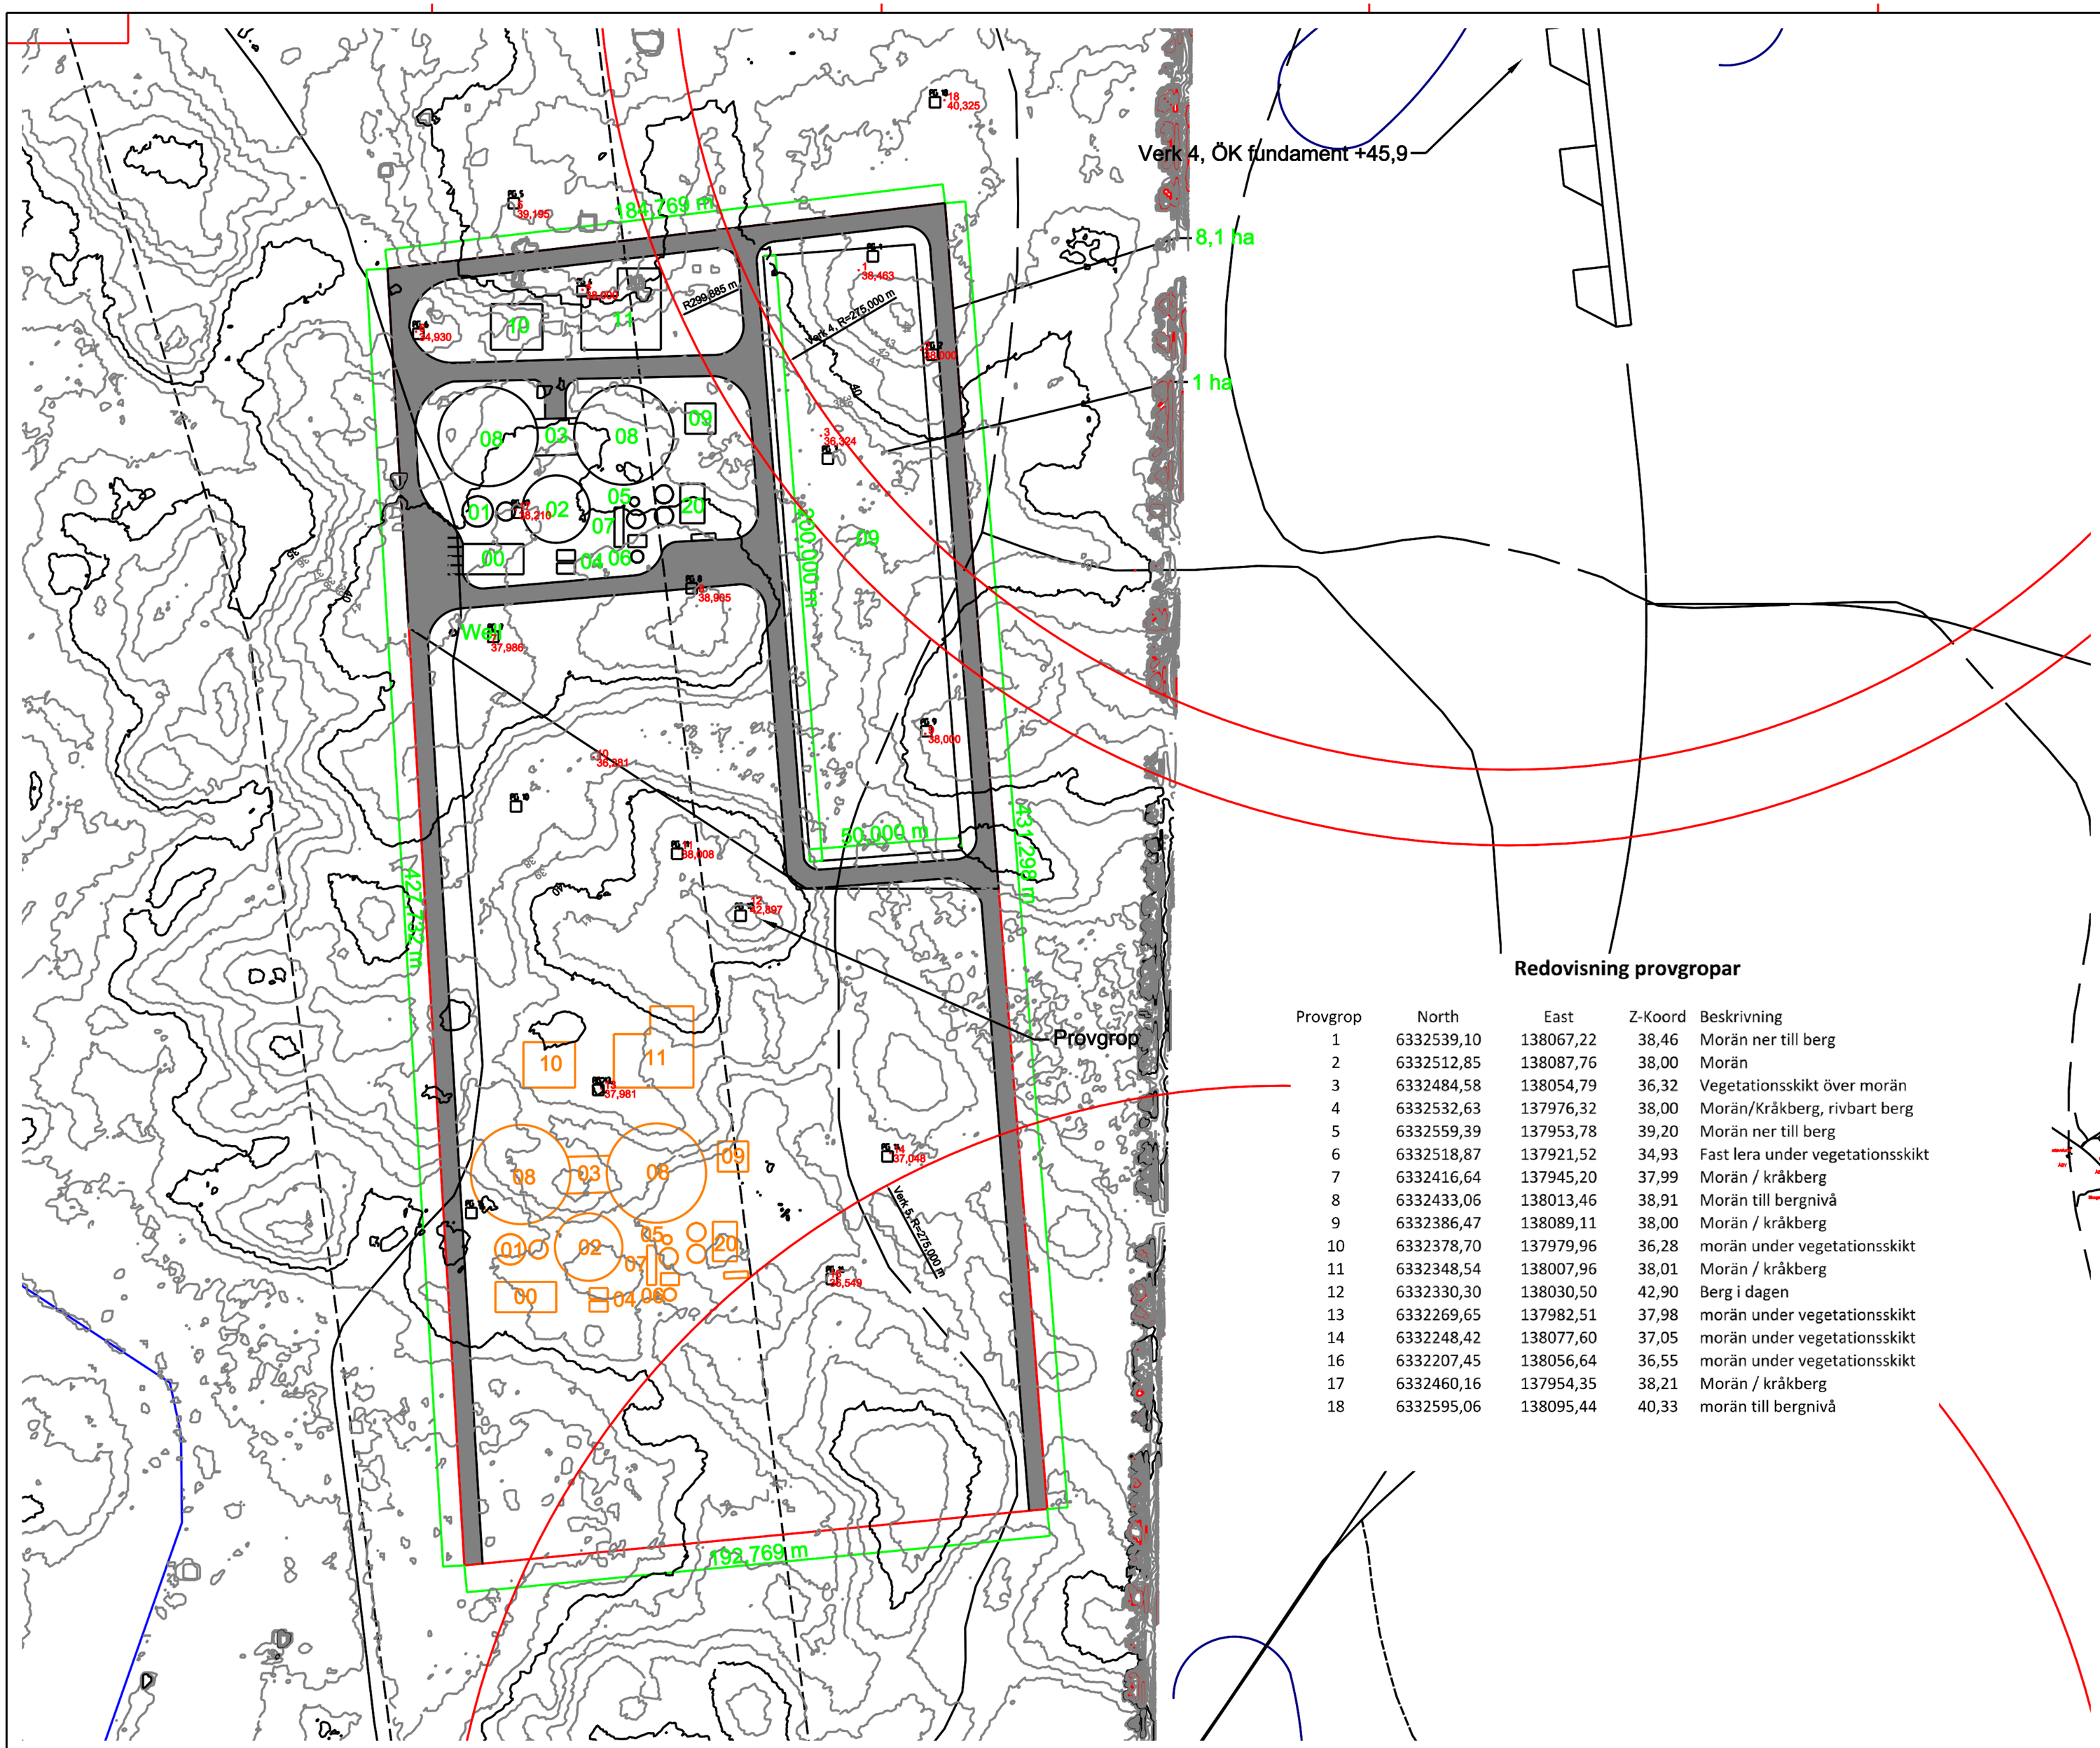

Redovisning provgropar

Provgrop	North	East	Z-Koord	Beskrivning
1	6332539,10	138067,22	38,46	Morän ner till berg
2	6332512,85	138087,76	38,00	Morän
3	6332484,58	138054,79	36,32	Vegetationsskikt över morän
4	6332532,63	137976,32	38,00	Morän/Kråkberg, rivbart berg
5	6332559,39	137953,78	39,20	Morän ner till berg
6	6332518,87	137921,52	34,93	Fast lera under vegetationsskikt
7	6332416,64	137945,20	37,99	Morän / kråkberg
8	6332433,06	138013,46	38,91	Morän till bergnivå
9	6332386,47	138089,11	38,00	Morän / kråkberg
10	6332378,70	137979,96	36,28	morän under vegetationsskikt
11	6332348,54	138007,96	38,01	Morän / kråkberg
12	6332330,30	138030,50	42,90	Berg i dagen
13	6332269,65	137982,51	37,98	morän under vegetationsskikt
14	6332248,42	138077,60	37,05	morän under vegetationsskikt
16	6332207,45	138056,64	36,55	morän under vegetationsskikt
17	6332460,16	137954,35	38,21	Morän / kråkberg
18	6332595,06	138095,44	40,33	morän till bergnivå

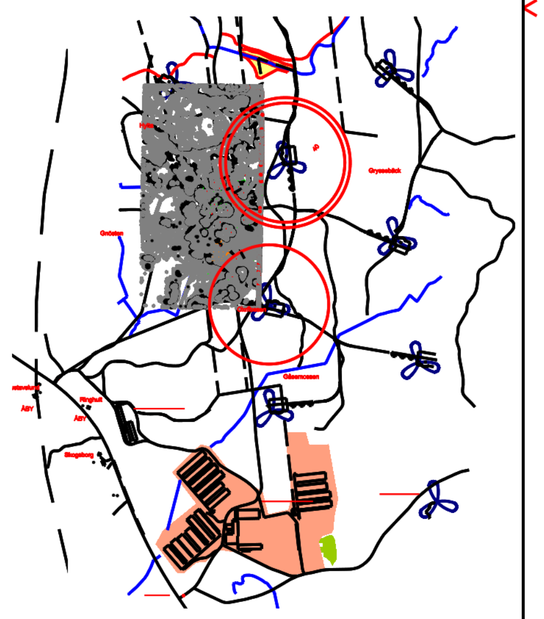

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

PROJEKTERINGSUNDERLAG

Claes Cedergren

Mölstad Entreprenad
HAGMARKSVÄGEN 11, 383 39 MÖNSTERÅS
070-603 80 06, molstad.entreprenad@telia.com

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
22-10	P.SVENSSON	
DATUM	ANSVARIG	
220421		

PLAN FÖR ETABLERING AV NY ENHET

SKALA	NUMMER	BET
1:1000		
